











노사협의체		결	작성	검토	승인
		재	문상현 3/27	/	배성우 /
현장	KT&G광주공장 자동창고증축 (물류시스템공급)	일시	2024년 02월 27일 13:00 ~ 14:00		
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 정기 <input type="checkbox"/> 임시	장소	SFA 안전교육장		
회의 내용	<p>1) 협의사항 - 시행규칙</p> <p>1. 산업재해 예방방법 및 산업재해가 발생한 경우의 대피방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23.11.02 비상대응(추락)훈련 실시 비상대피로 피난경로등 훈련 및 교육 실시</li> <li>- 24년도 상반기 실시 예정 (일정 협의 후)</li> <li>- 산업재해 발생시 비상연락망을 통한 보고체계 확립 준수 및 비상대피로 숙지 준수</li> </ul> <p>2. 작업의 시작시간, 작업 및 작업장 간의 연락방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아침조회 시간 : 07시 35분 / 작업시작 시간 : 08시 00분 / 작업종료 시간 : 17시 00분</li> <li>- 무전기 / 휴대전화 (SFA - 안전보건관리(총괄)책임자 : 010-5534-0991, 안전관리자 : 010-7647-2499) (미릉산업 - 현장소장 김정동 : 010-5382-8889 / 공사팀장 최홍수 : 010-3609-1928) (세진FA 현장소장 양영식 : 010-9258-4718 / 한국자동화 현장소장 김규환 : 010-8708-8021)</li> </ul> <p>3. 그 밖의 산업재해 예방과 관련된 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인보호구 착용 관리 및 중장비 사용 작업시 안전조치, 공도구 점검 등 예방에 관한 사항 협의</li> <li>- 중장비 사용시 접근금지 조치 실시 및 신호수 배치 등 협의</li> <li>- C/V 2층 정위치 작업 및 레벨링 작업, 덕트 시공 및 케이블 포설 작업 시 추락 위험에 관한 사항</li> </ul> <p>2) 협의사항 - 산업안전보건위원회 심의의결</p> <p>1. 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전관리계획서</li> </ul> <p>2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024.01.15 전면 개정 수정 후 공지 근로자대표 서명 등 / 차후 변경시 추후 공지 예정</li> </ul> <p>3. 안전보건교육에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규채용시 교육은 현장 투입시, 특별,정기,관리감독자 교육 등 교육일정 협의 후 사전 공지</li> </ul> <p>4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023.09.21 작업환경측정 하반기 실시 -&gt; 2024년 03월 작업환경측정 상반기 실시 예정</li> </ul> <p>5. 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업시간 및 휴게시간 준수 및 고혈압근로자 혈압측정,혈압약 복용 관리 및 현장내 음주측정 불시 점검 예정</li> <li>- 2024.01.24 미릉산업 (2명) 특수건강검진 실시</li> </ul> <p>6. 중대재해 원인조사 및 재발방지 대책에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차후 예정</li> </ul> <p>7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차후 예정</li> </ul> <p>8. 유해하거나 위험한 기계·기구·설비를 도입한 경우 안전 및 보건 관련 조치에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유해·위험 기계·기구·설비 반입시 공도구 및 보호커버,방호덮개,기타 안전조치 등 점검 실시 후 현장 투입 예정</li> </ul> <p>9. 그 밖에 해당 사업장 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진시키기 위하여 필요한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혹한기 방한용품 관련 건설업 산업안전보건관리비 운용기준 안내 (햇팩,발열조끼는 혹한기 기간 근로자 건강장해 예방을 위해 사용되는 품목으로서 목적 외 사용 우려가 적어 한시적(12~2월)으로 사용 가능하나 방한복,방한모,방한화,방한장갑,목토시,귀덮개 등 근로자에게 지급하는 피복비는 복리후생비에 해당되어 사용 불가)</li> <li>- 각반,턱끈 등 산업안전보건관리비 사용 불가</li> <li>- 공사 진행 중 필요 요청 사항 즉시 반영 예정</li> <li>- 위험성 평가 회의 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; 기존 작업 외 추가 발생시 위험성평가서 추가 작성 제출 요망</li> <li>-&gt; 위험성평가서 작성시 보건관련 내용 추가 작성 요망</li> </ul> </li> </ul>				

회의  
내용

- 3) 협의사항 - 안전
1. 근로자 건강관리 대책
  2. 작업 후 정리정돈 생활화
  3. 크레인 작업시 라운드슬링, 사클 등 관리 방안
  4. 고소 작업 근로자 추락 및 공도구 낙하 위험 관리 방안
  5. 화기 작업구간 화재 관리 방안
- 4) 협의사항 - 토의 내용
1. 개인보호구 착용 관리 철저
  2. 작업종료 10분 전에 현장 주변 정리정돈 실시
  3. 크레인 작업시 라운드슬링, 사클 상시 점검 및 작업 종료 후 보관함에 보관 관리
  4. 고소 작업원 전체식 안전벨트 착용 및 안전고리 이중걸이 체결 / 공도구 이탈방지끈 지급 사용 관리
  5. 화기 작업구간 소화기 비치, 화기감시원 배치, 불티비산 방지포 설치 관리
- 5) 건의사항
1. 장기근속자 안전화 지급 요청 (미릉 - 박종욱 반장)
  2. 현장에서 근로자 개인보호구 착용 관리 요청 (SFA - 배성우 소장)
  3. 상하복 동시 작업 금지 관리 요청 (SFA - 문창현 선임)

참석자	근로자 위원			사용자 위원		
	소속	성명	서명	소속	성명	서명
	미릉산업	박종욱		SFA	배성우	
	미릉산업	김원빈		SFA	문창현	
	미릉산업	김종운		미릉산업	최홍수	
	세진FA	박호진		세진FA	양영식	
	한국자동화	권기영		한국자동화	김규완	

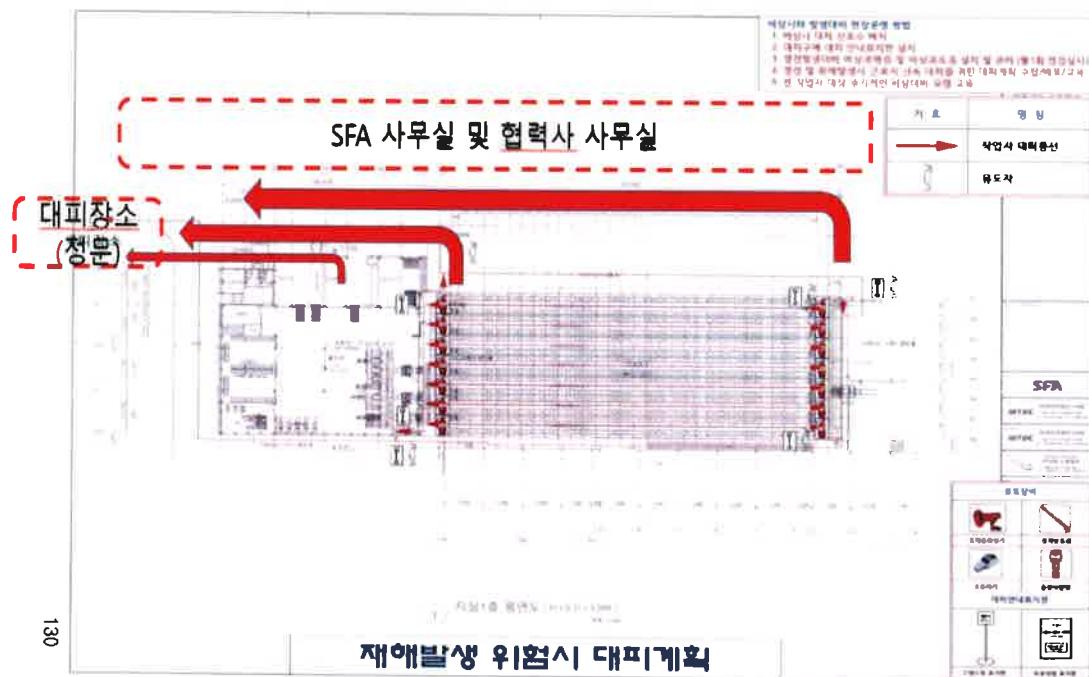
※ 사진 대지 별도 첨부

# 사진대지



공사명	KT&G광주공장 자동창고증축	일시	2022.02.27
내용	24년 02월 노사협의체		

## 재해발생 위험시 대피계획



공사명	KT&G광주공장 자동창고증축	일시	2022.02.27
내용	KT&G 광주공장 자동창고 증축공사 비상대피로		
